Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**ECOPARQUE FAMILIAR UF1**	**166 días**	**mar 15/06/2**	**lun 27/12/21**	
2		**OBRAS PRELIMINARES**	**160 días**	**mar 15/06/2**	**sáb 18/12/21**	
3		EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	160 días	mar 15/06/21	sáb 18/12/21	
4		COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	160 días	mar 15/06/21	sáb 18/12/21	
5		CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2 X 2, APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PA	3 días	mar 15/06/21	jue 17/06/21	
6		DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	4 días	jue 17/06/21	mar 22/06/21	5
7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE [illegible]	1 día	mar 15/06/21	mié 16/06/21	4CC
8		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**55 días**	**mar 22/06/2**	**vie 27/08/21**	
9		EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	10 días	mar 22/06/21	sáb 3/07/21	6
10		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	9 días	vie 25/06/21	mié 7/07/21	9CC+3 días
11		RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	7 días	mié 7/07/21	jue 15/07/21	10
12		RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	8 días	jue 15/07/21	lun 26/07/21	11
13		MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	28 días	lun 26/07/21	vie 27/08/21	12
14		**PILOTAJE EN MADERA**	66 días	sáb 10/07/21	sáb 25/09/21	8FC-40 días
15		**PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA**	66 días	mié 11/08/21	mar 26/10/2	14FC-40 día
16		**BARANDAS EN MADERA**	70 días	sáb 2/10/21	jue 23/12/21	15FC-20 día
17		**EDIFICACIONES EN MADERA**	**118 días**	**mié 11/08/2**	**lun 27/12/21**	

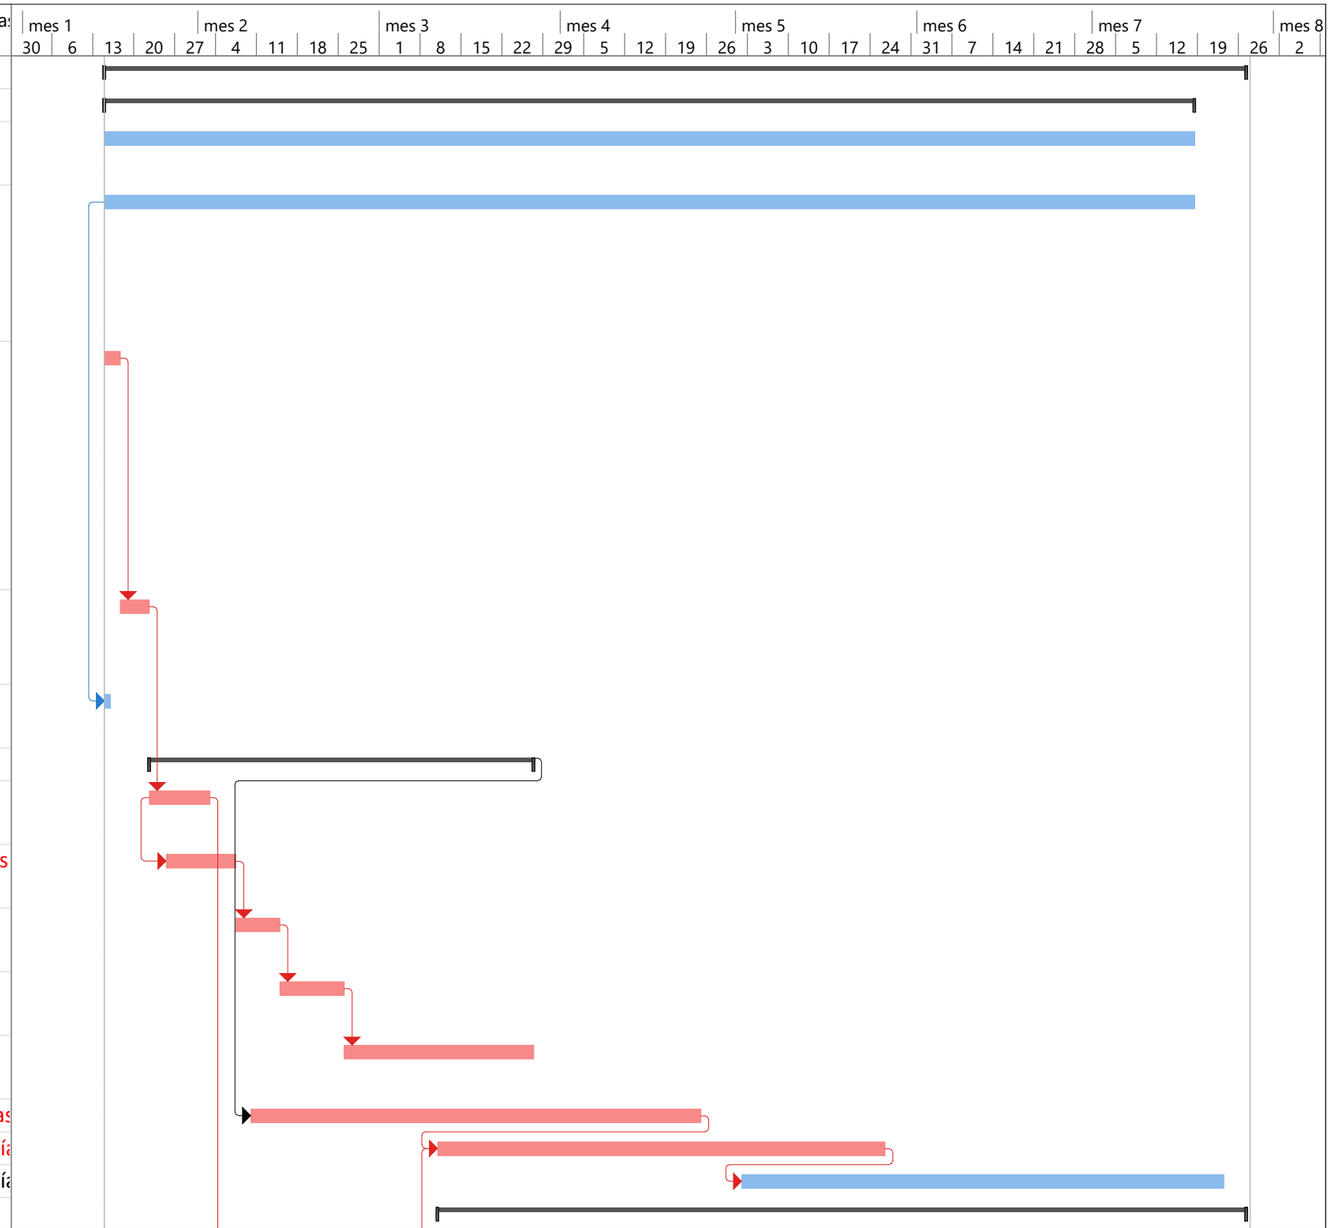

Proyecto: Cronograma UF1 ECO
Fecha: mié 12/05/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	25 días	vie 8/10/21	mar 9/11/21	24FC-5 días
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	17 días	mié 3/11/21	lun 22/11/21	18FC-5 días
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	22 días	vie 10/09/21	mié 6/10/21	27FC-10 días
21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	6 días	mié 6/10/21	mar 12/10/21	20
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	14 días	mar 16/11/21	jue 2/12/21	19FC-5 días
23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	4 días	jue 14/10/21	mié 20/10/21	24
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	8 días	mié 6/10/21	jue 14/10/21	20
25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	30 días	mié 11/08/21	mar 14/09/21	15CC
26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	14 días	mié 1/09/21	jue 16/09/21	25FF+2 días
27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	17 días	vie 3/09/21	mié 22/09/21	26CC+2 días
28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	20 días	jue 2/12/21	lun 27/12/21	22
29		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**122 días**	**sáb 3/07/21**	**mié 24/11/2**	
30		**CIMENTACIONES**	**55 días**	**sáb 3/07/21**	**mié 8/09/21**	
31		EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	4 días	sáb 3/07/21	vie 9/07/21	9

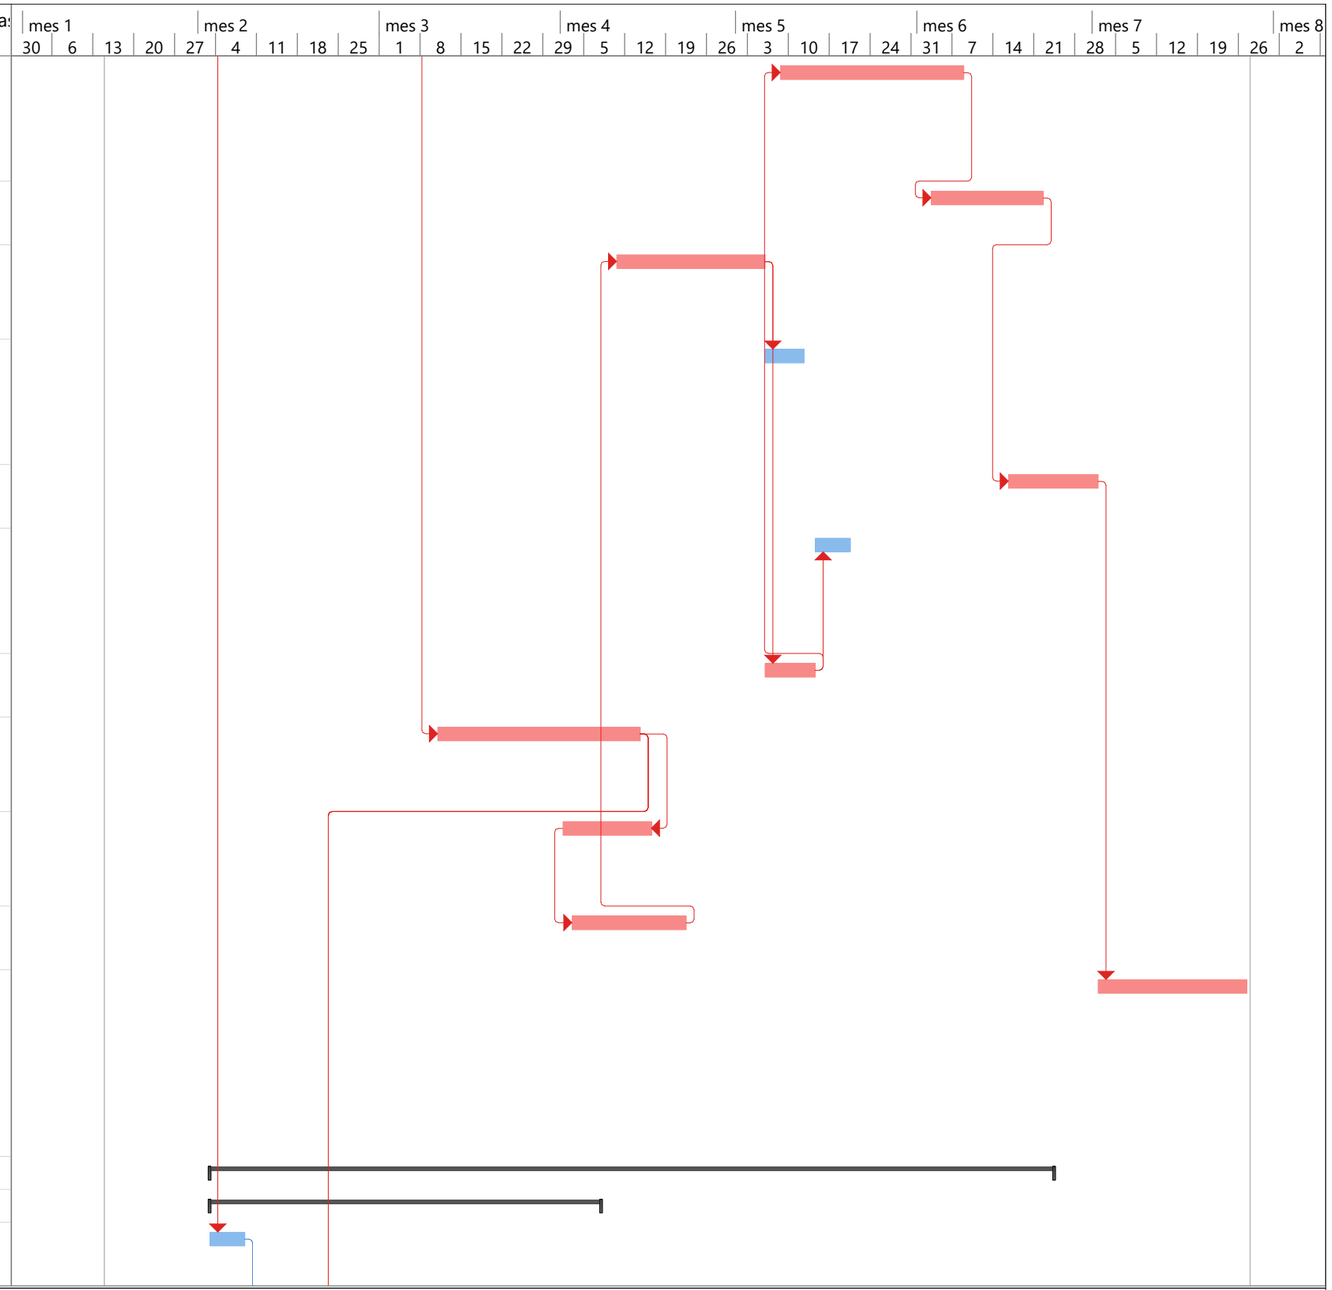

Proyecto: Cronograma UF1 ECO
Fecha: mié 12/05/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
32		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	2 días	vie 9/07/21	lun 12/07/21	31
33		SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	12 días	lun 2/08/21	mar 17/08/21	37
34		ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	18 días	mié 4/08/21	jue 26/08/21	33CC+2 días
35		VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	12 días	lun 23/08/21	lun 6/09/21	34CC+15 días
36		CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	2 días	lun 6/09/21	mié 8/09/21	35
37		CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA	18 días	lun 12/07/21	lun 2/08/21	32
38		MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	18 días	lun 12/07/21	lun 2/08/21	32
39		**ESTRUCTURA**	**46 días**	**lun 2/08/21**	**vie 24/09/21**	
40		COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	15 días	lun 2/08/21	vie 20/08/21	34FC-20 días
41		VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	15 días	vie 20/08/21	mar 7/09/21	40
42		PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	14 días	mar 7/09/21	mié 22/09/21	41
43		IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	2 días	mié 22/09/21	vie 24/09/21	42
44		**TANQUE**	**11 días**	**vie 24/09/21**	**mié 6/10/21**	
45		TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F"C = 28 MPA	8 días	vie 24/09/21	lun 4/10/21	39
46		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKA FILL O	3 días	lun 4/10/21	mié 6/10/21	45
47		**ACERO DE REFUERZO**	**78 días**	**jue 26/08/21**	**mié 24/11/2**	
48		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	78 días	jue 26/08/21	mié 24/11/21	34

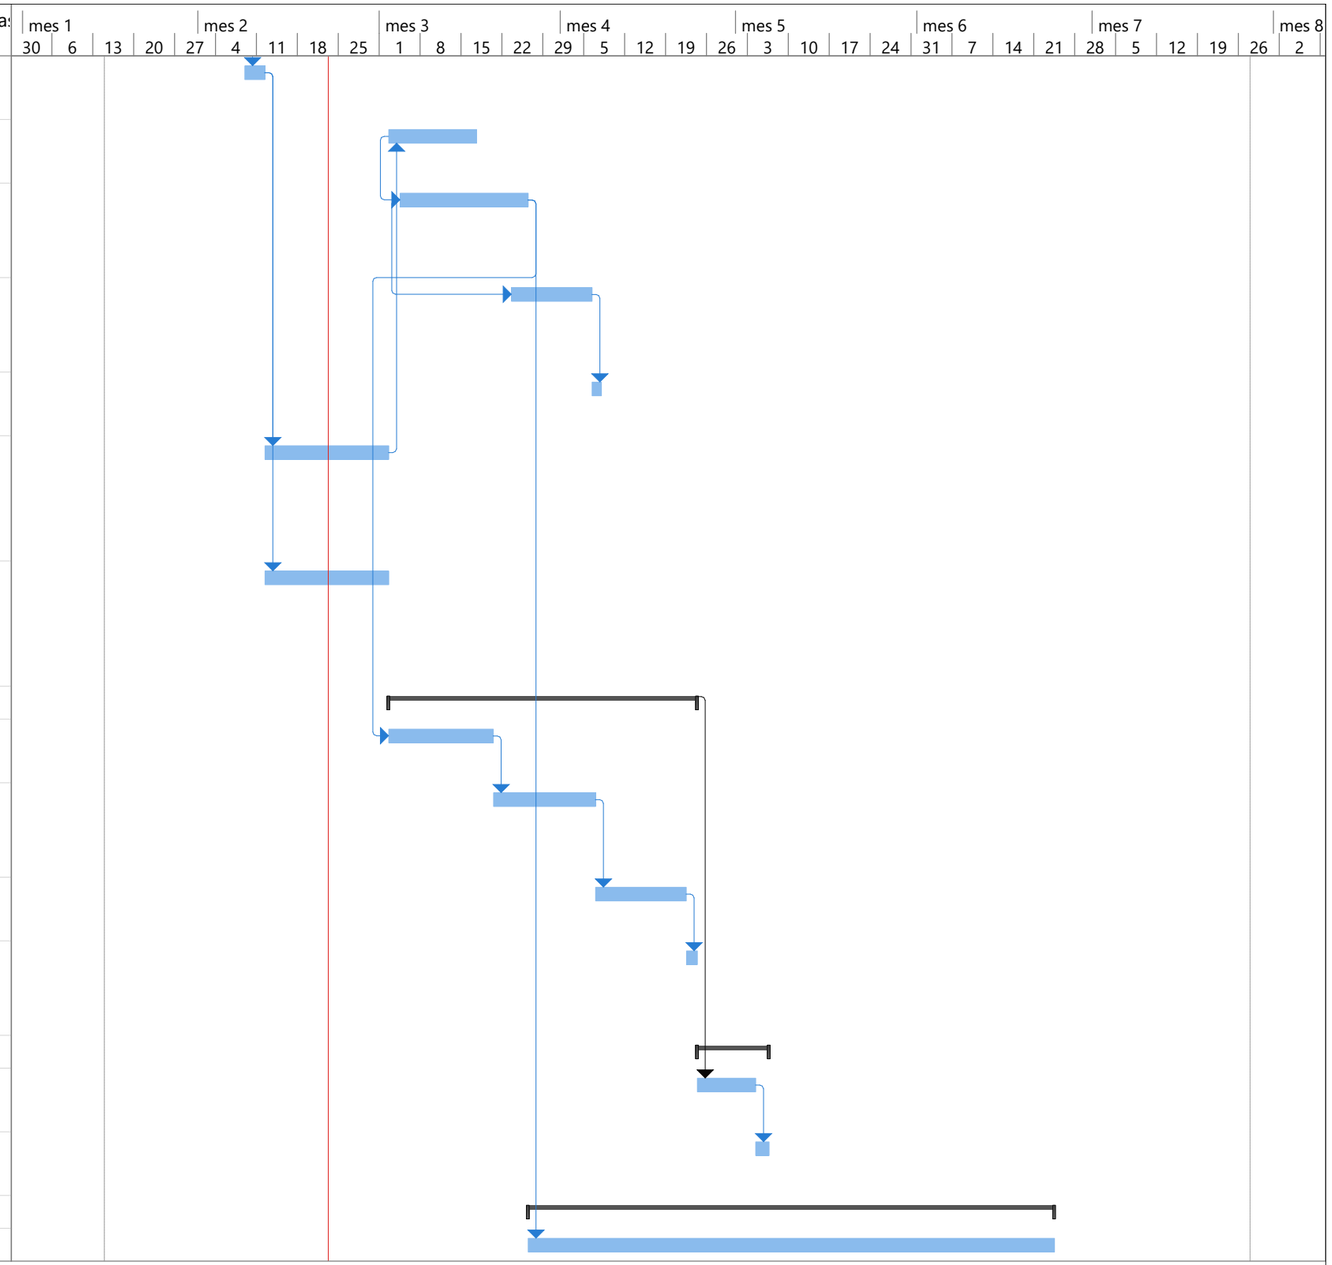

Proyecto: Cronograma UF1 ECO
Fecha: mié 12/05/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
49		**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS**	**46 días**	**mié 22/09/2**	**lun 15/11/21**	
61		**PISOS Y ENCHAPES**	**41 días**	**vie 24/09/21**	**jue 11/11/21**	
69		**CIELOS RASOS**	10 días	mar 2/11/21	vie 12/11/21	66
70		**PAVIMENTOS Y ANDENES**	25 días	jue 28/10/21	vie 26/11/21	49FC-15 día
71		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	15 días	mié 3/11/21	vie 19/11/21	62
72		**URBANISMO Y EXTERIORES**	29 días	sáb 20/11/21	vie 24/12/21	70FC-5 días
73		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI**	110 días	lun 26/07/21	mar 30/11/2	25FC-44 día
74		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	110 días	lun 26/07/21	mar 30/11/2	25FC-44 día
75		**INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS**	110 días	lun 26/07/21	mar 30/11/21	25FC-44 días
76		**INSTALACIONES VOZ Y DATOS**	110 días	lun 26/07/21	mar 30/11/2	25FC-44 día
77		**PRESUPUESTO SEÑALIZACION**	10 días	jue 25/11/21	mar 7/12/21	76FC-4 días
78		**PROVISIONES**	**160 días**	**mar 15/06/2**	**sáb 18/12/21**	
79		PMA	160 días	mar 15/06/2	sáb 18/12/21	
80		PMT	160 días	mar 15/06/2	sáb 18/12/21	
81		CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	160 días	mar 15/06/21	sáb 18/12/21	
82		TOTEMS DE INFORMACION	160 días	mar 15/06/2	sáb 18/12/21	
83		PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	160 días	mar 15/06/2	sáb 18/12/21	
84		SISTEMA DE RIEGO	160 días	mar 15/06/2	sáb 18/12/21	

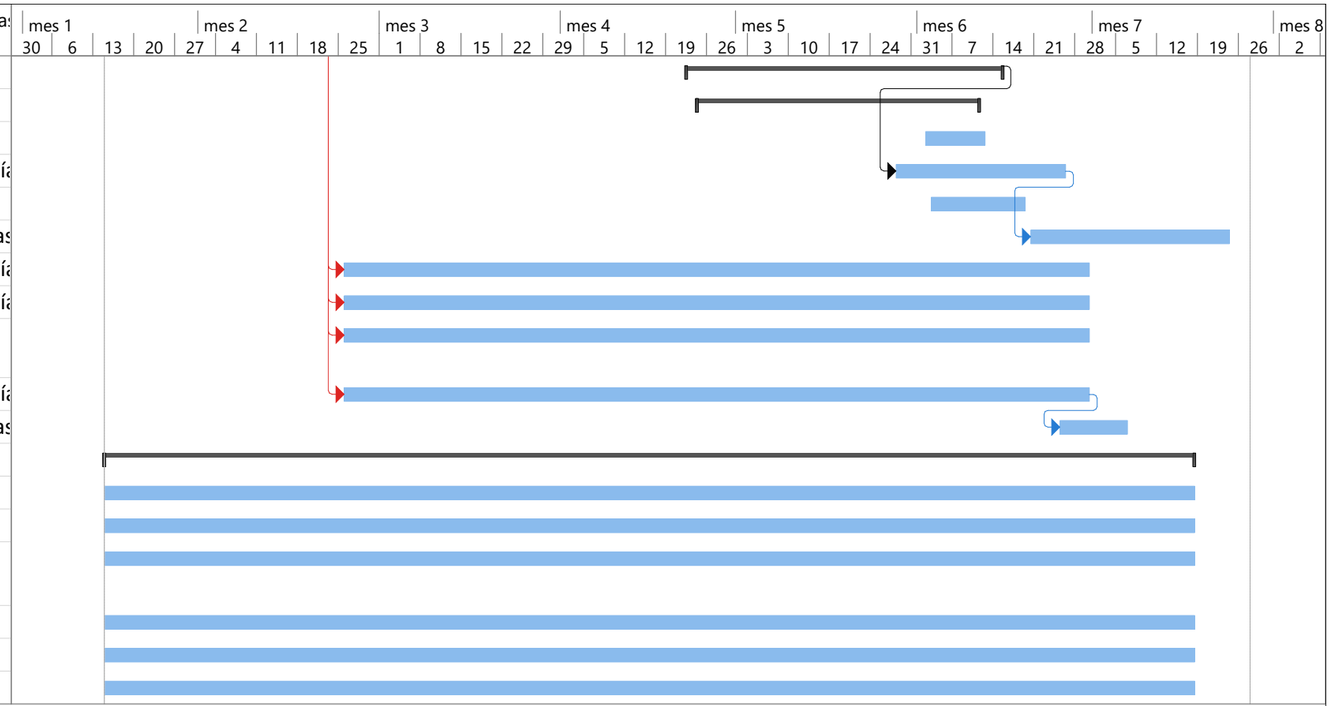

Proyecto: Cronograma UF1 ECO
Fecha: mié 12/05/21

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	
